



LEGENDA

- Pracovní místa na sil. II/475
- Stávající svislé dopravní značení
- Zrušené stávající svislé dopravní značení
- Navržené přechodné svislé dopravní značení
- Objízdná trasa - Ostrava, Havířov, Stonava, Žilina
- Objízdná trasa - Bohumín, Karviná

*- 30 km/h nedopoučejí
(předešlý úsek)*

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODSOB KARVINÁ
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



Odsouhlaseno dne: 26.5.2024
Č.j. KRPT-289212 /OJ- 2023 -070306
Dle § 77 z. č. 361/00 Sb.
příloha č. 1

Poř. Pr. Mgr. Martin Dyszkiewicz
21.5.2024
Vedoucí DI Karviná
















VYPRACOVALA BARBORA KUČEROVÁ	DATUM ŘÍJEN 2023	Č. VÝKRESU 01
NÁZEV AKCE Oprava sil. II/475, Stonava		
NÁZEV VÝKRESU Provizorní dopravní značení		



Brantice 430, 793 93 Brantice
e-mail: info@znackyomorava.cz

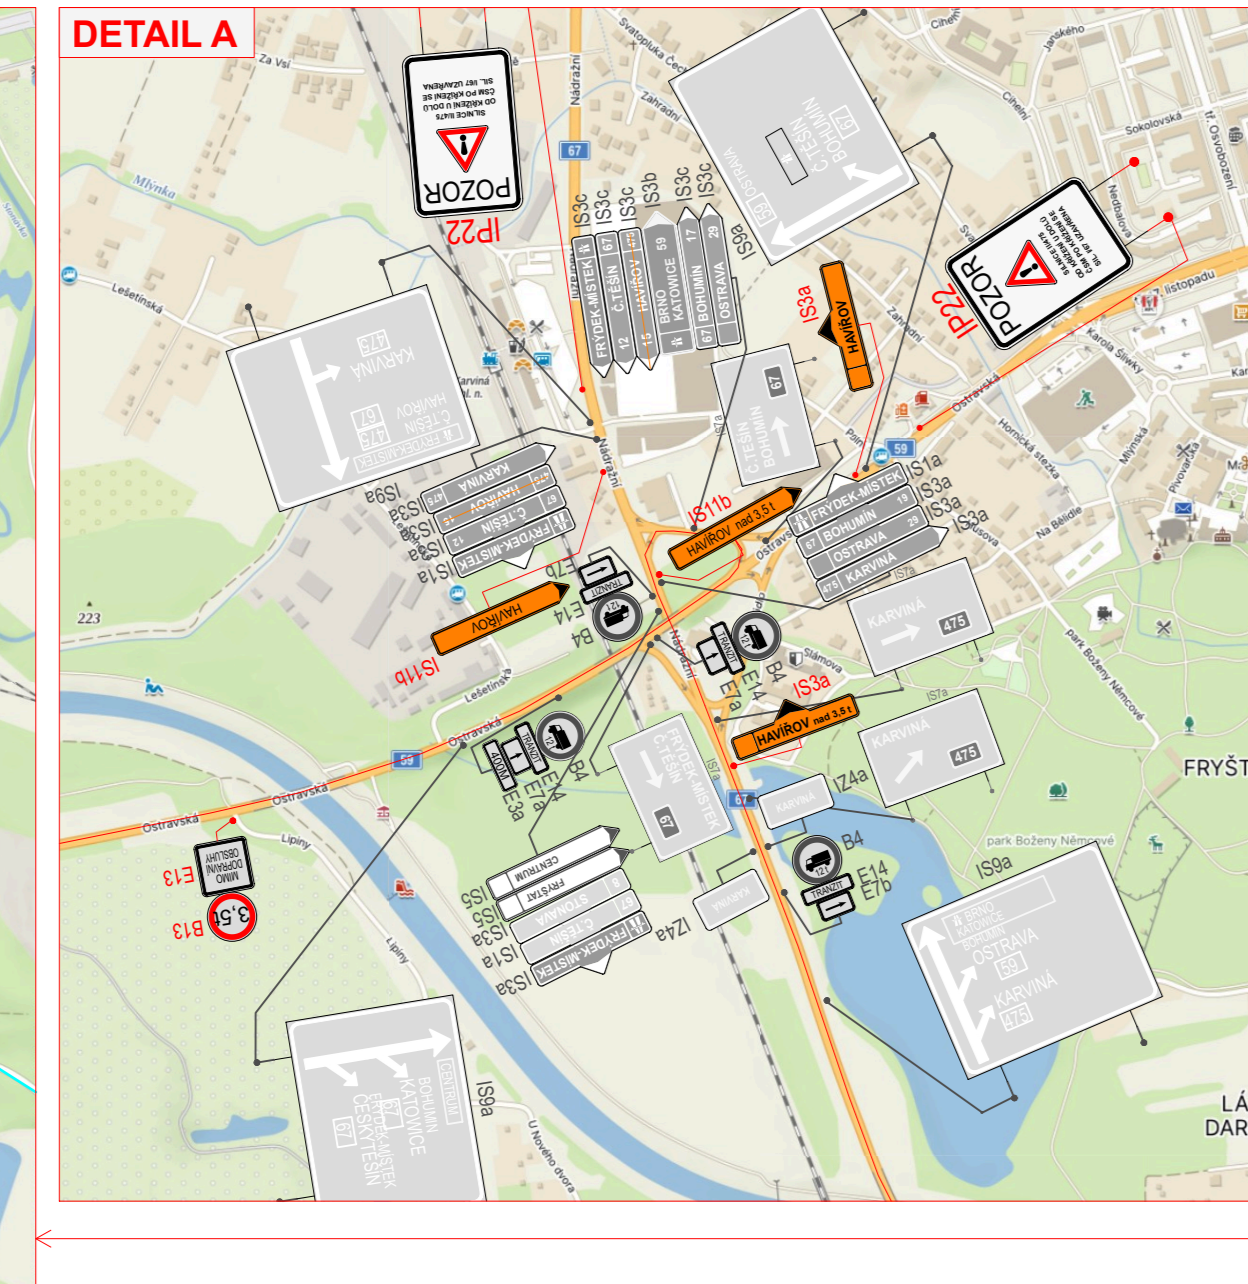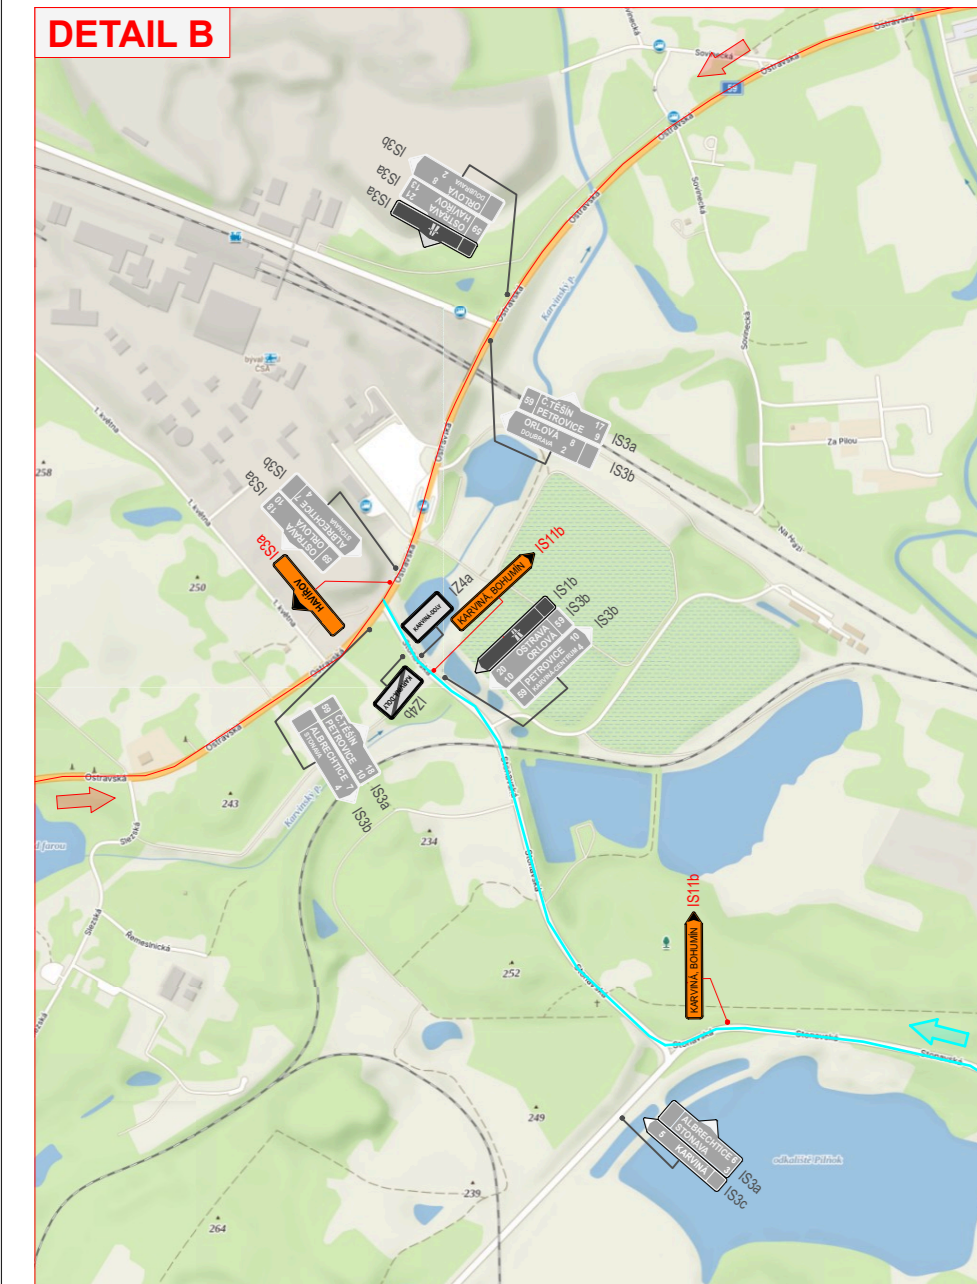

DETAIL MÍSTA ÚPRAVY

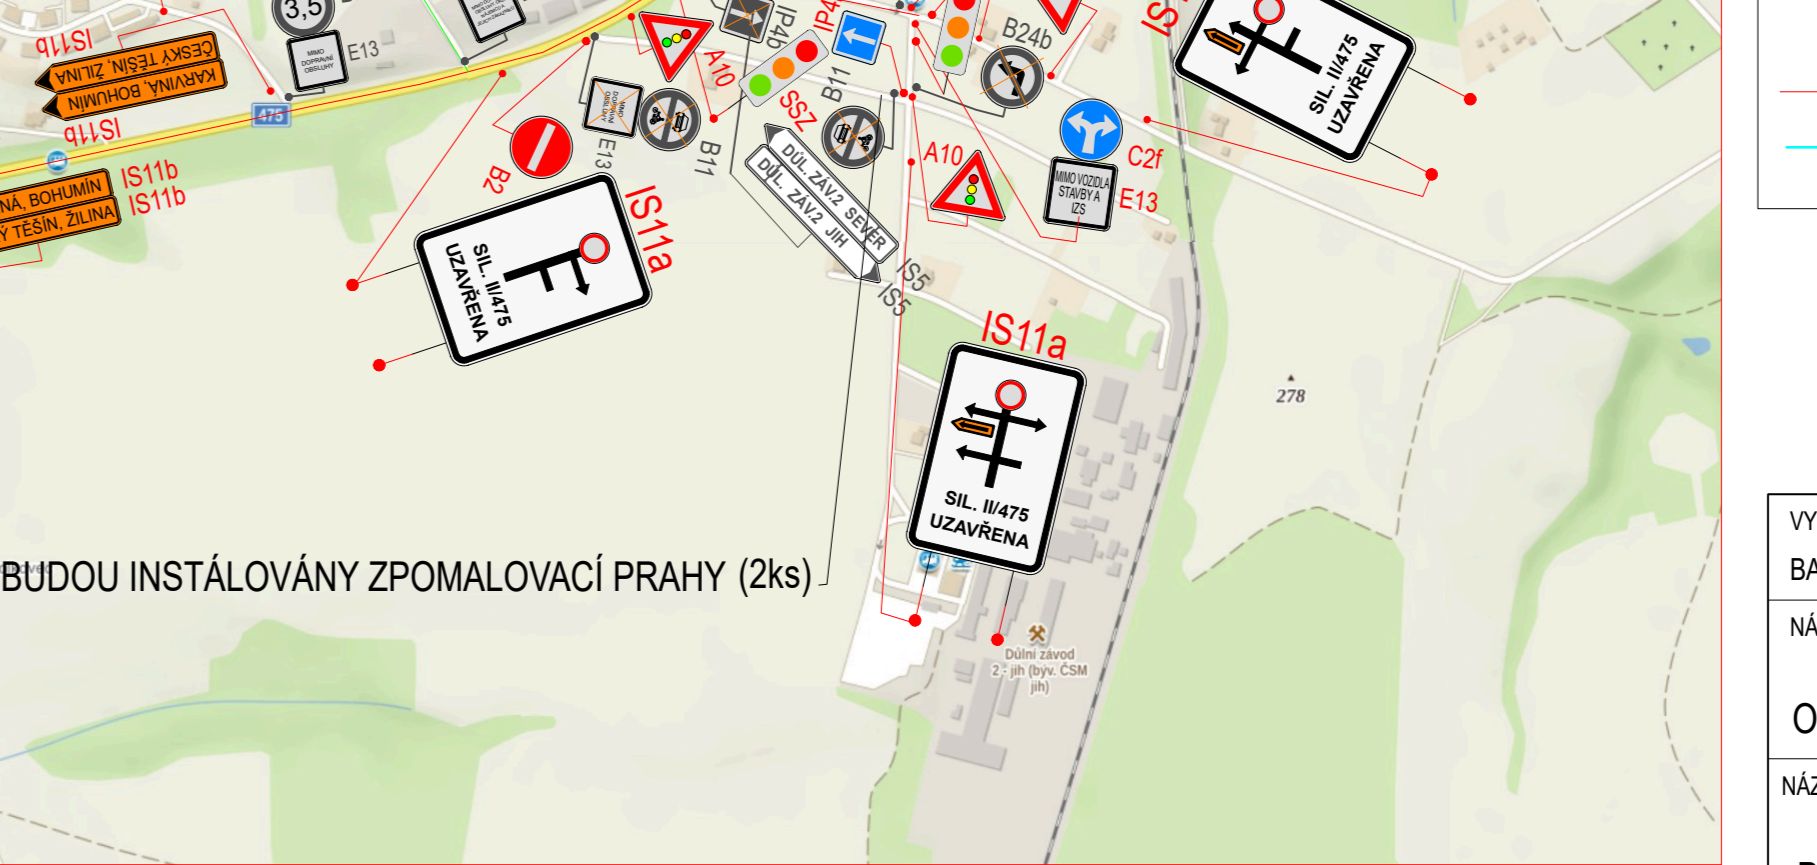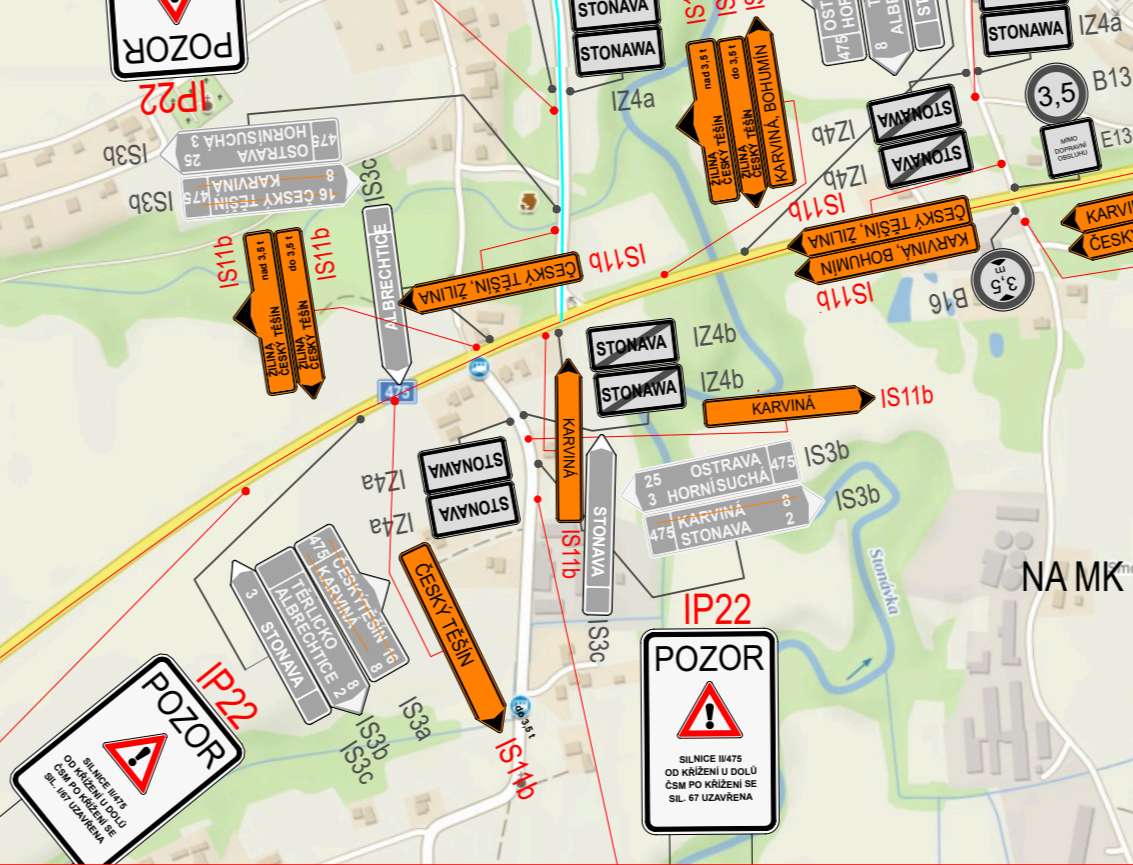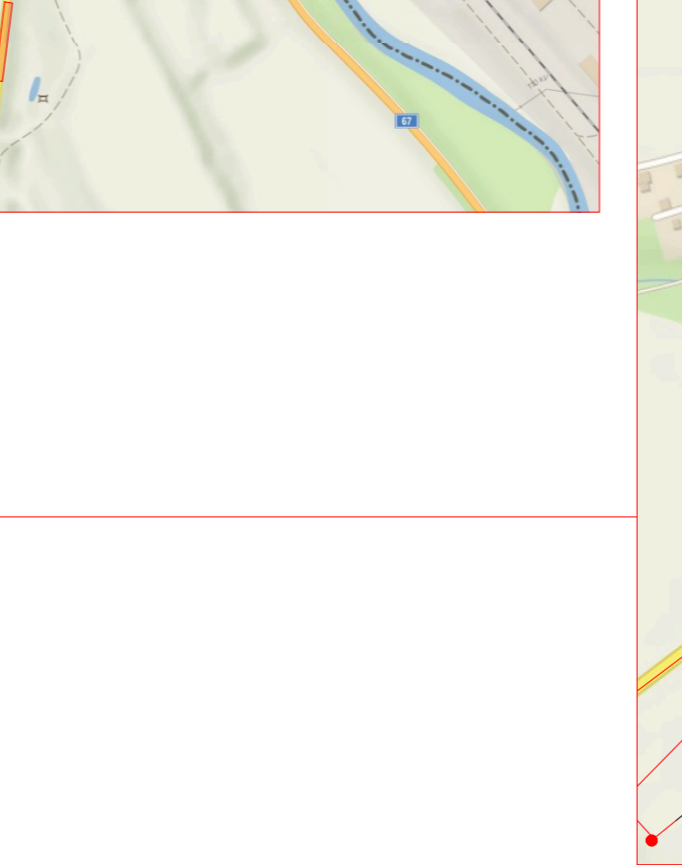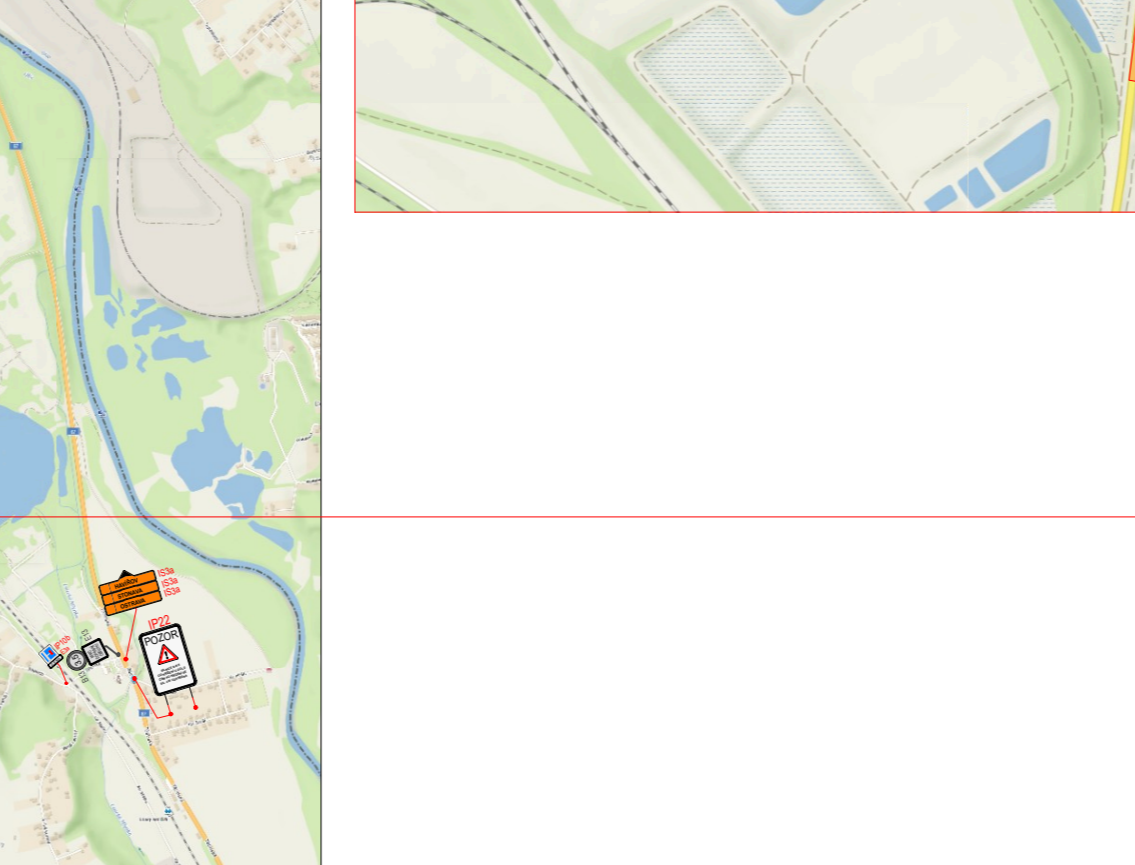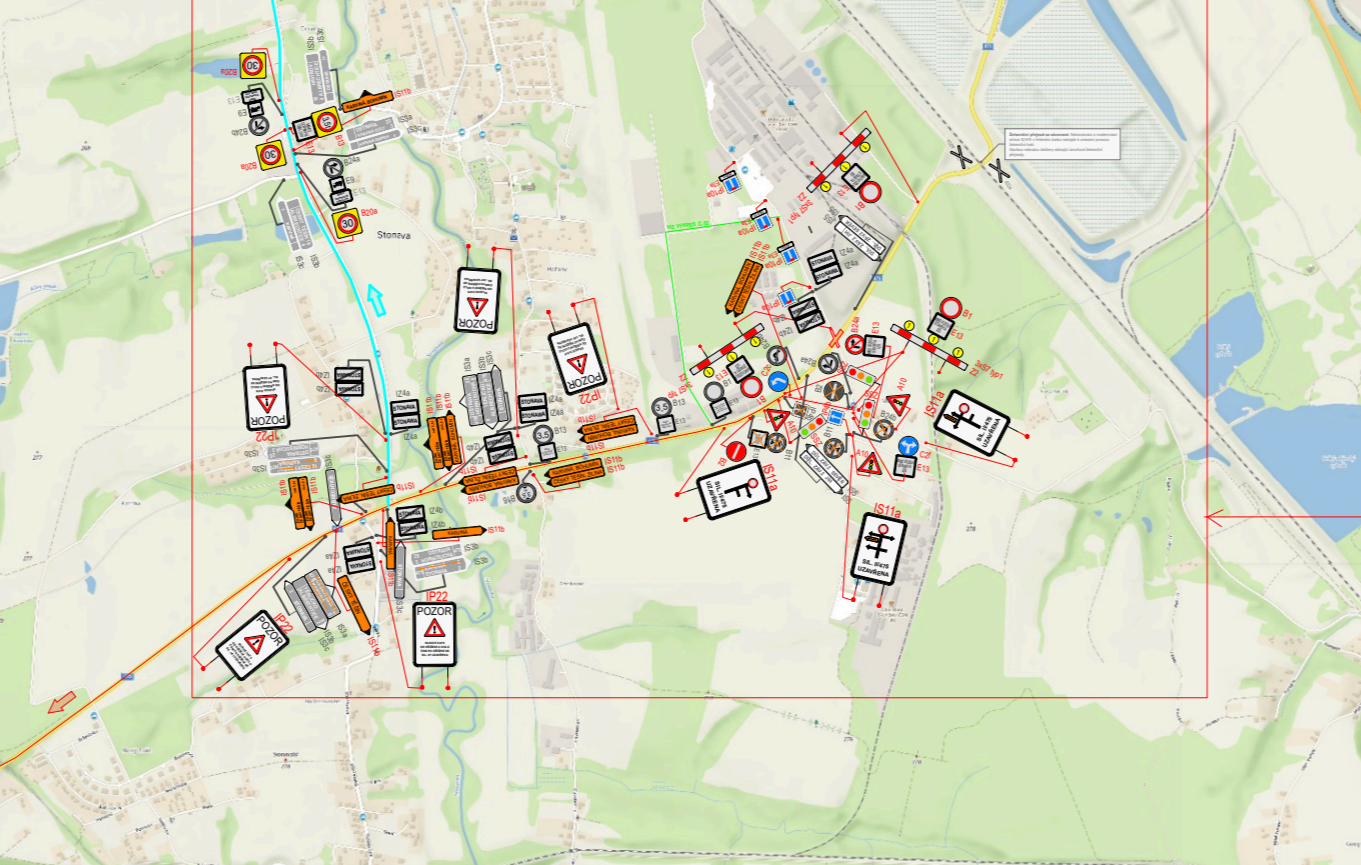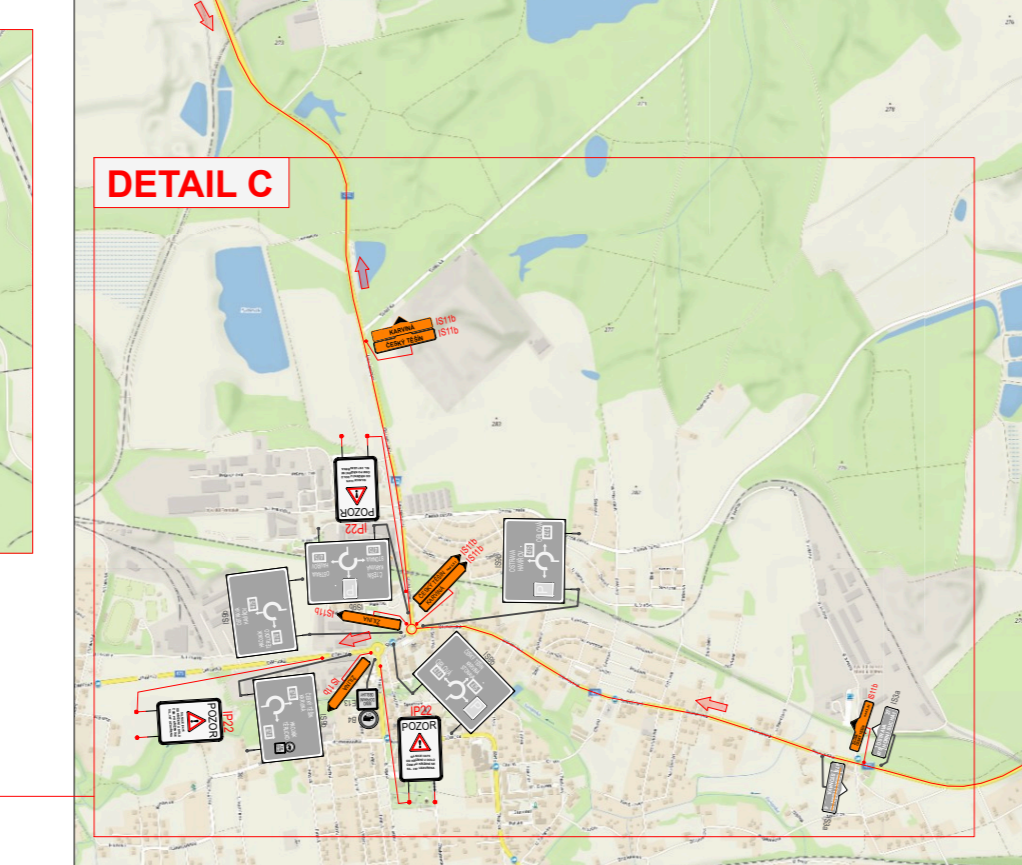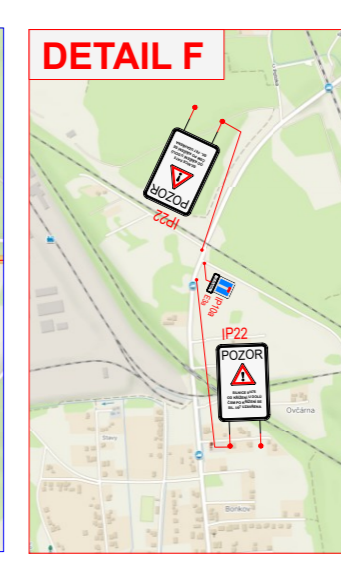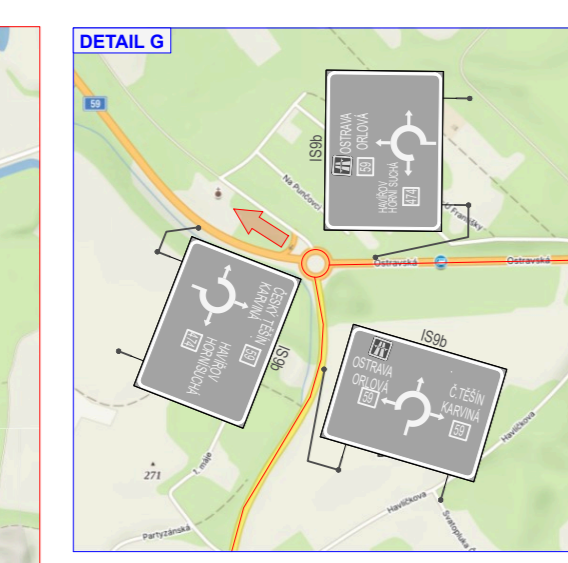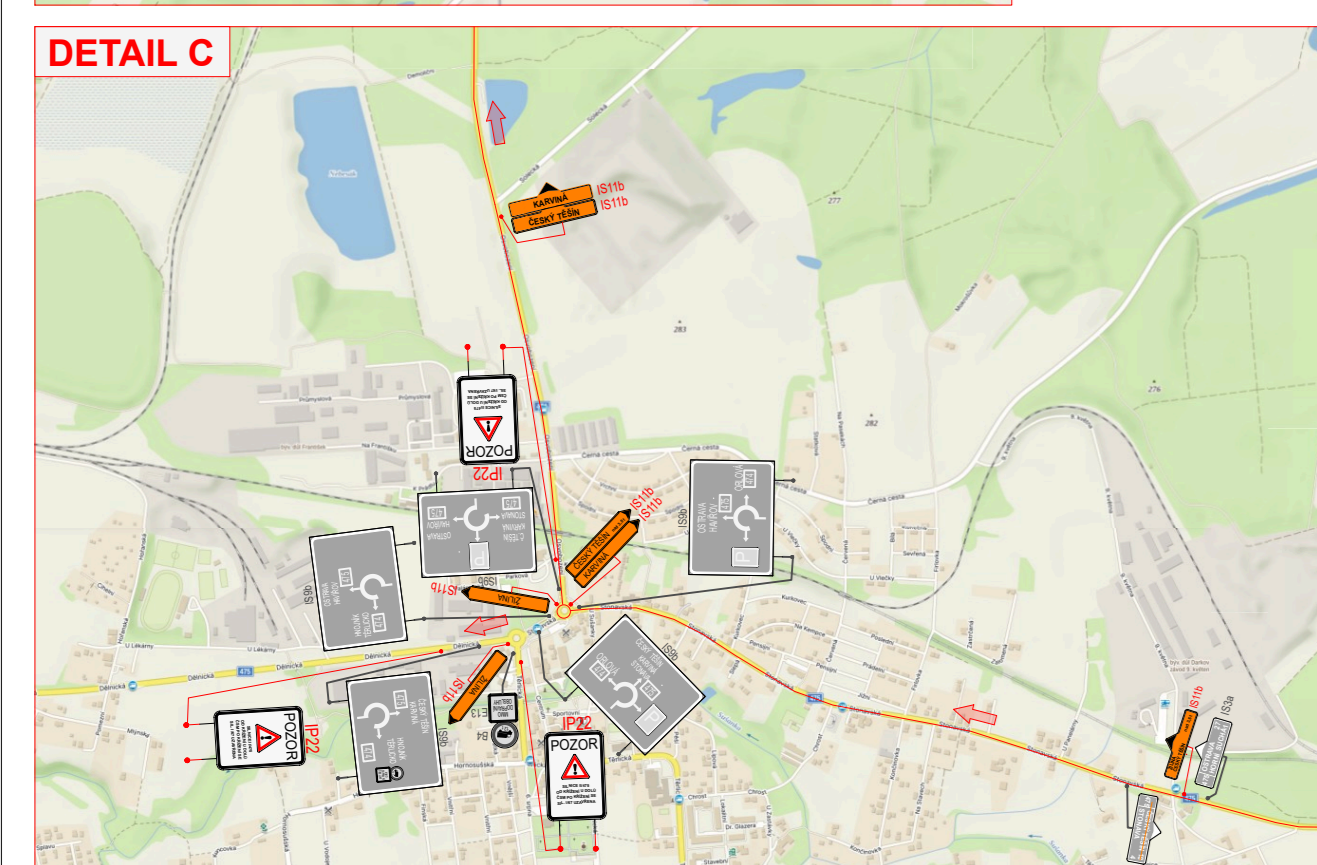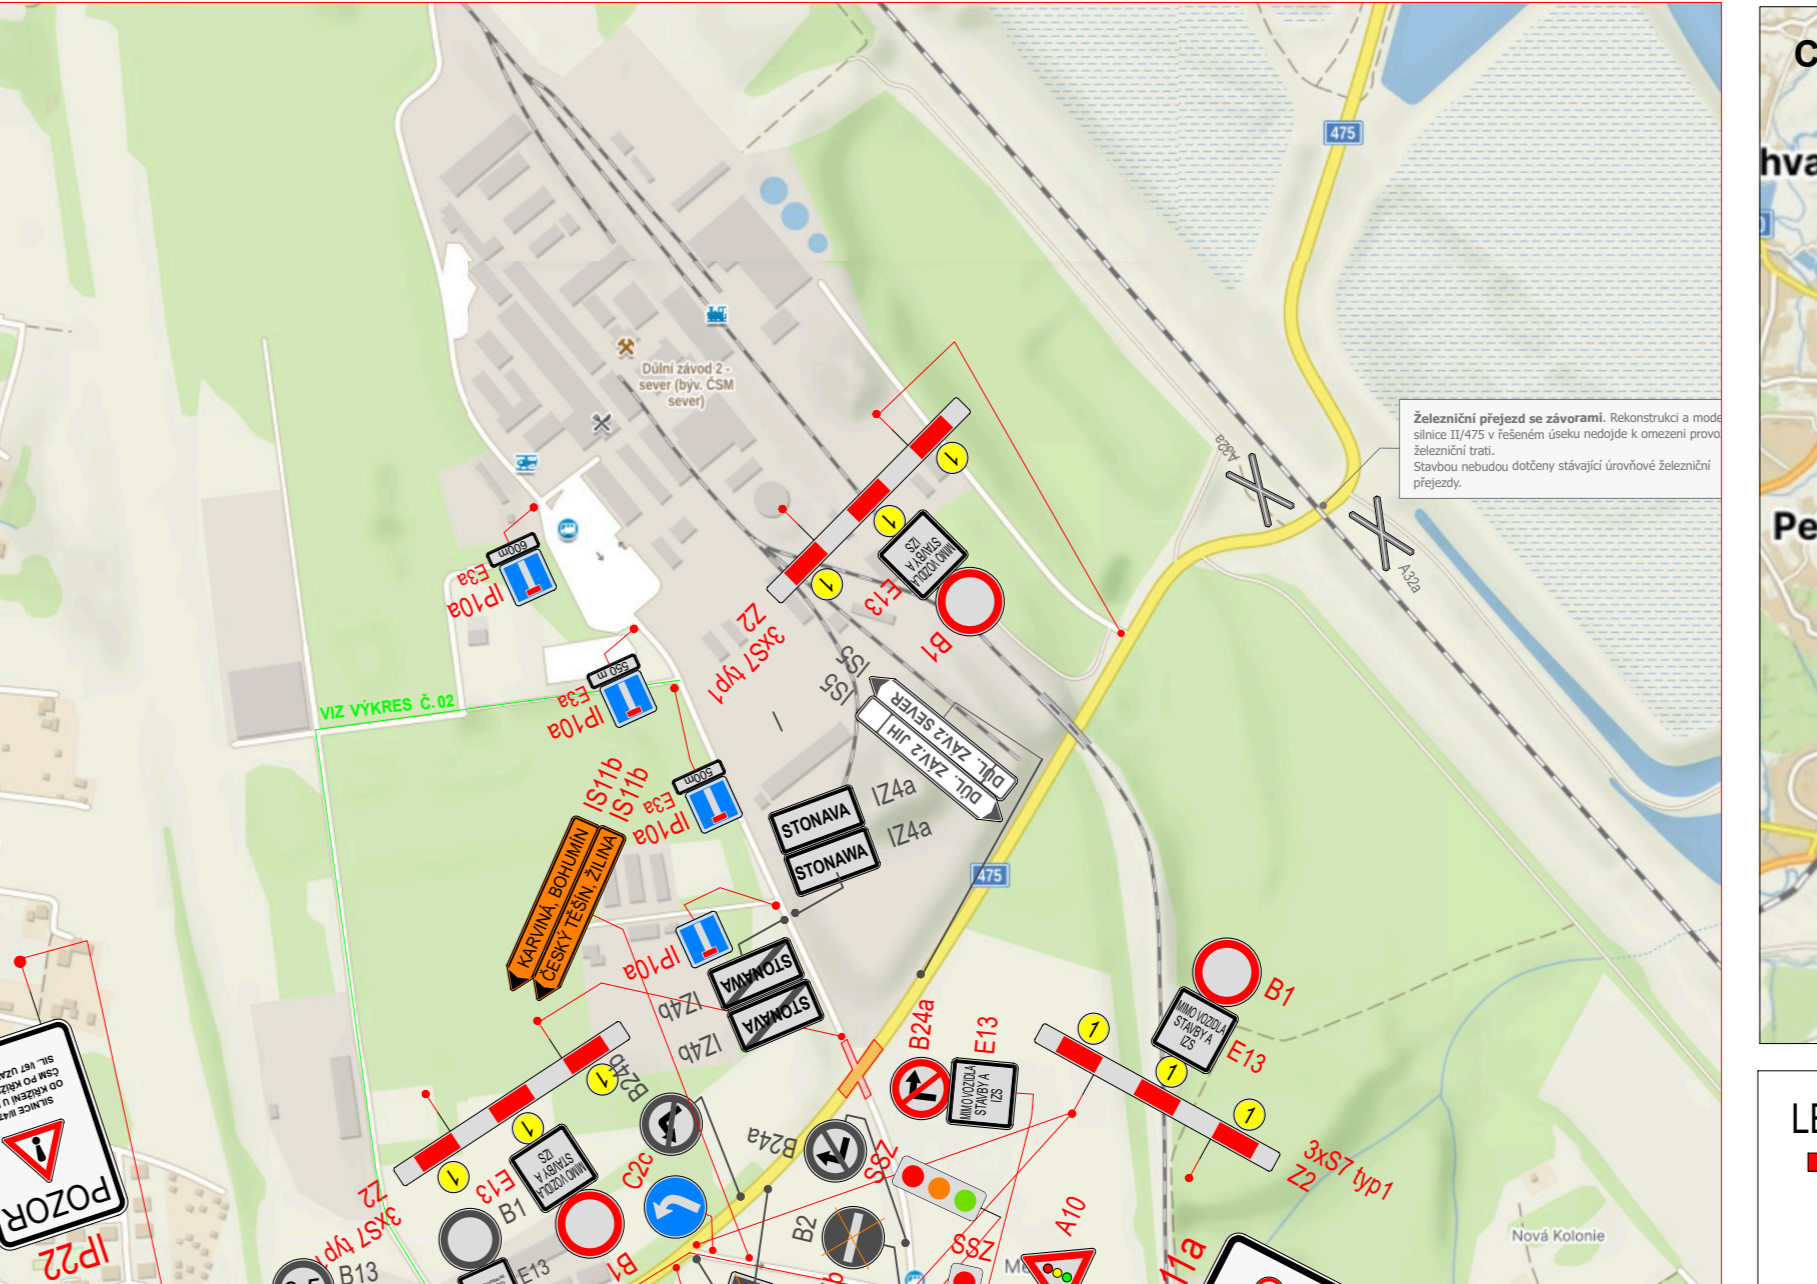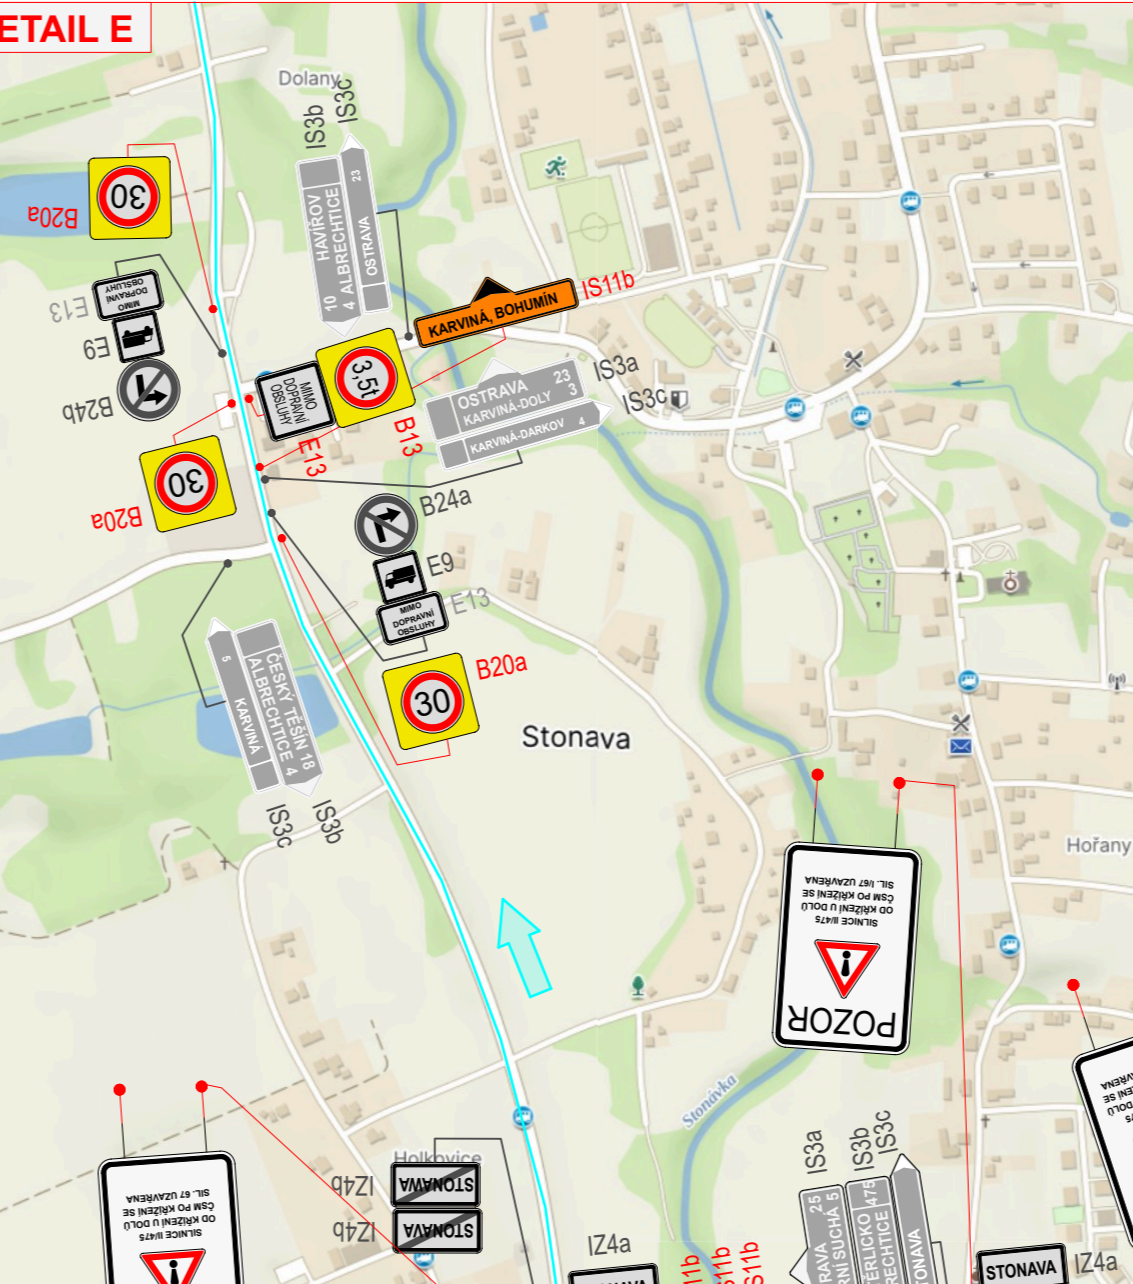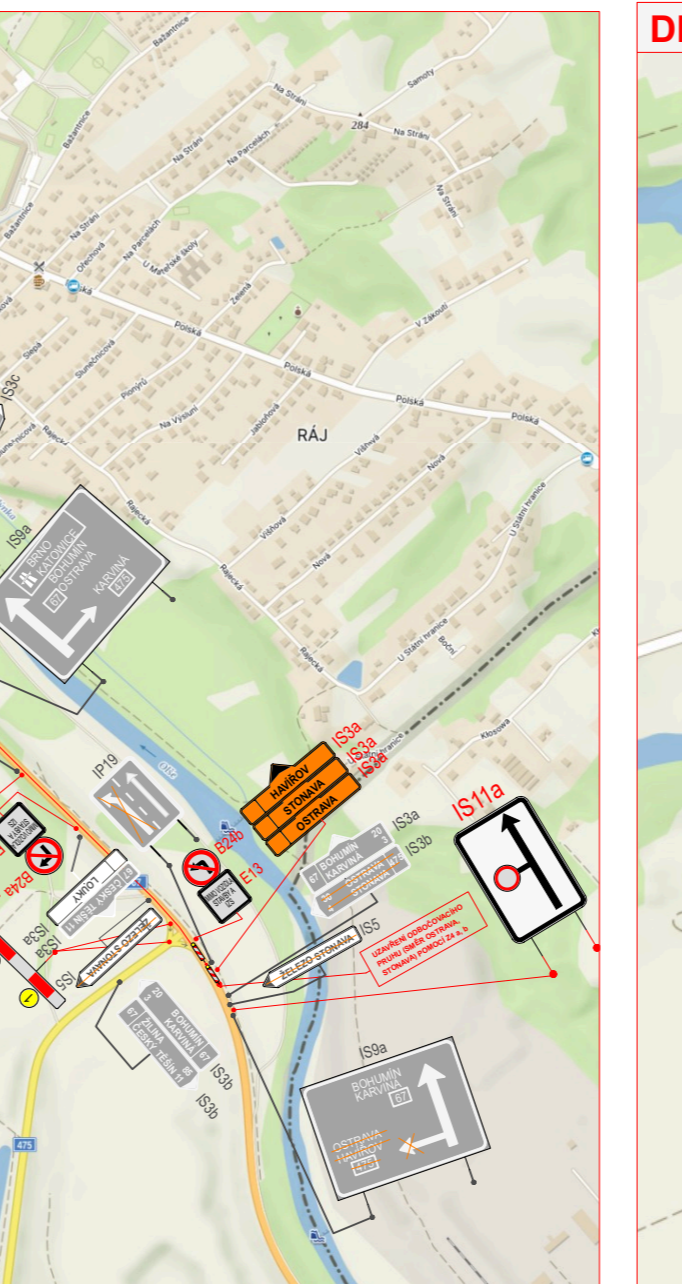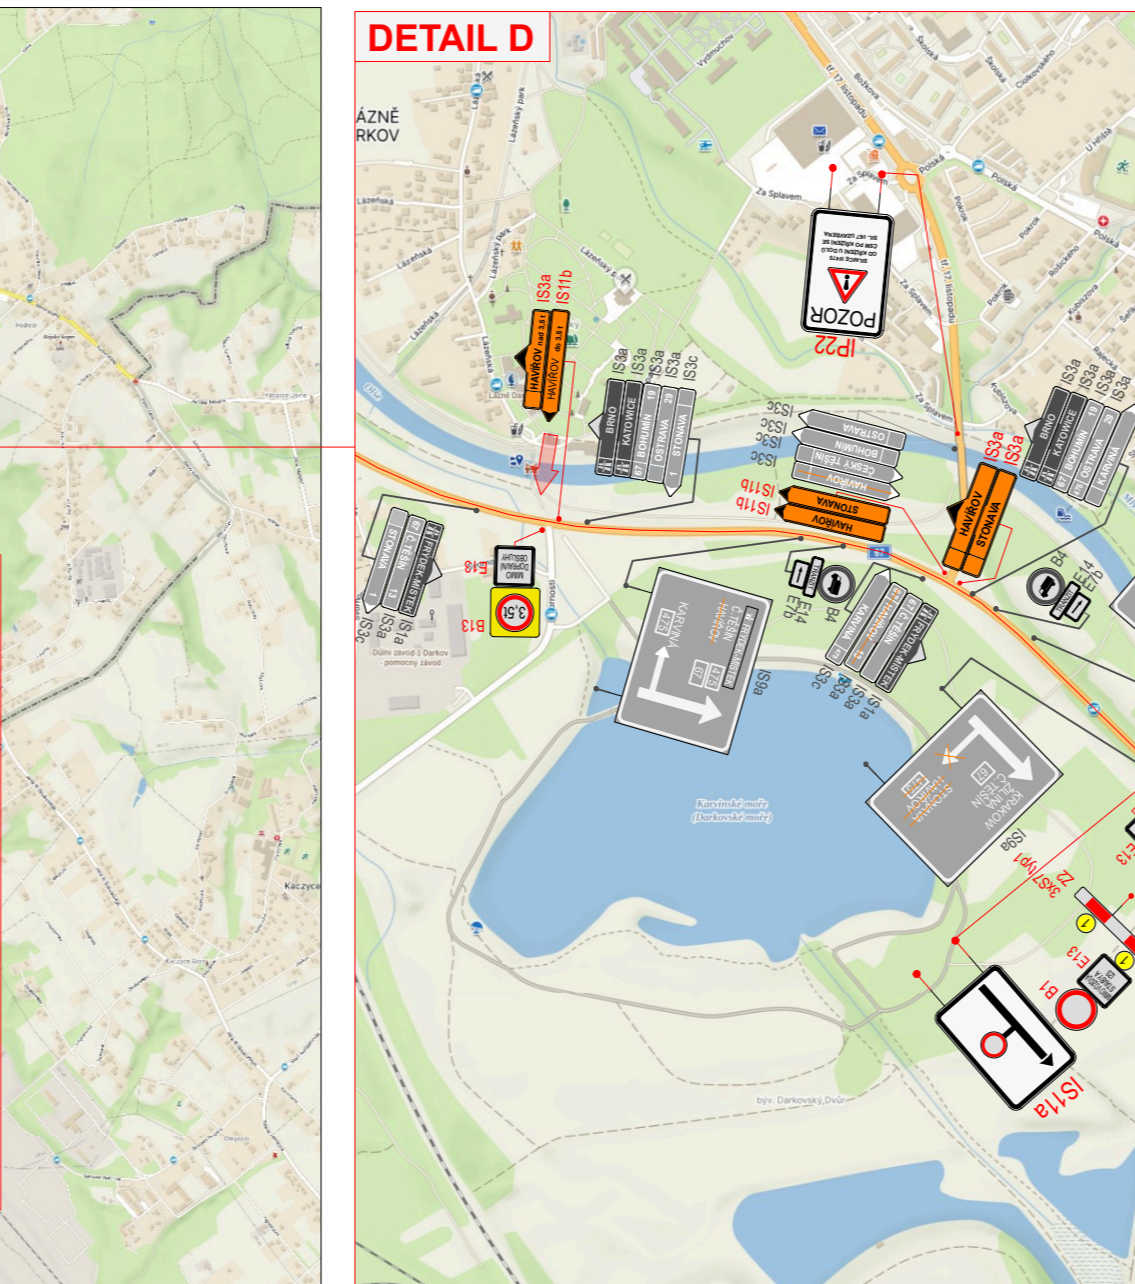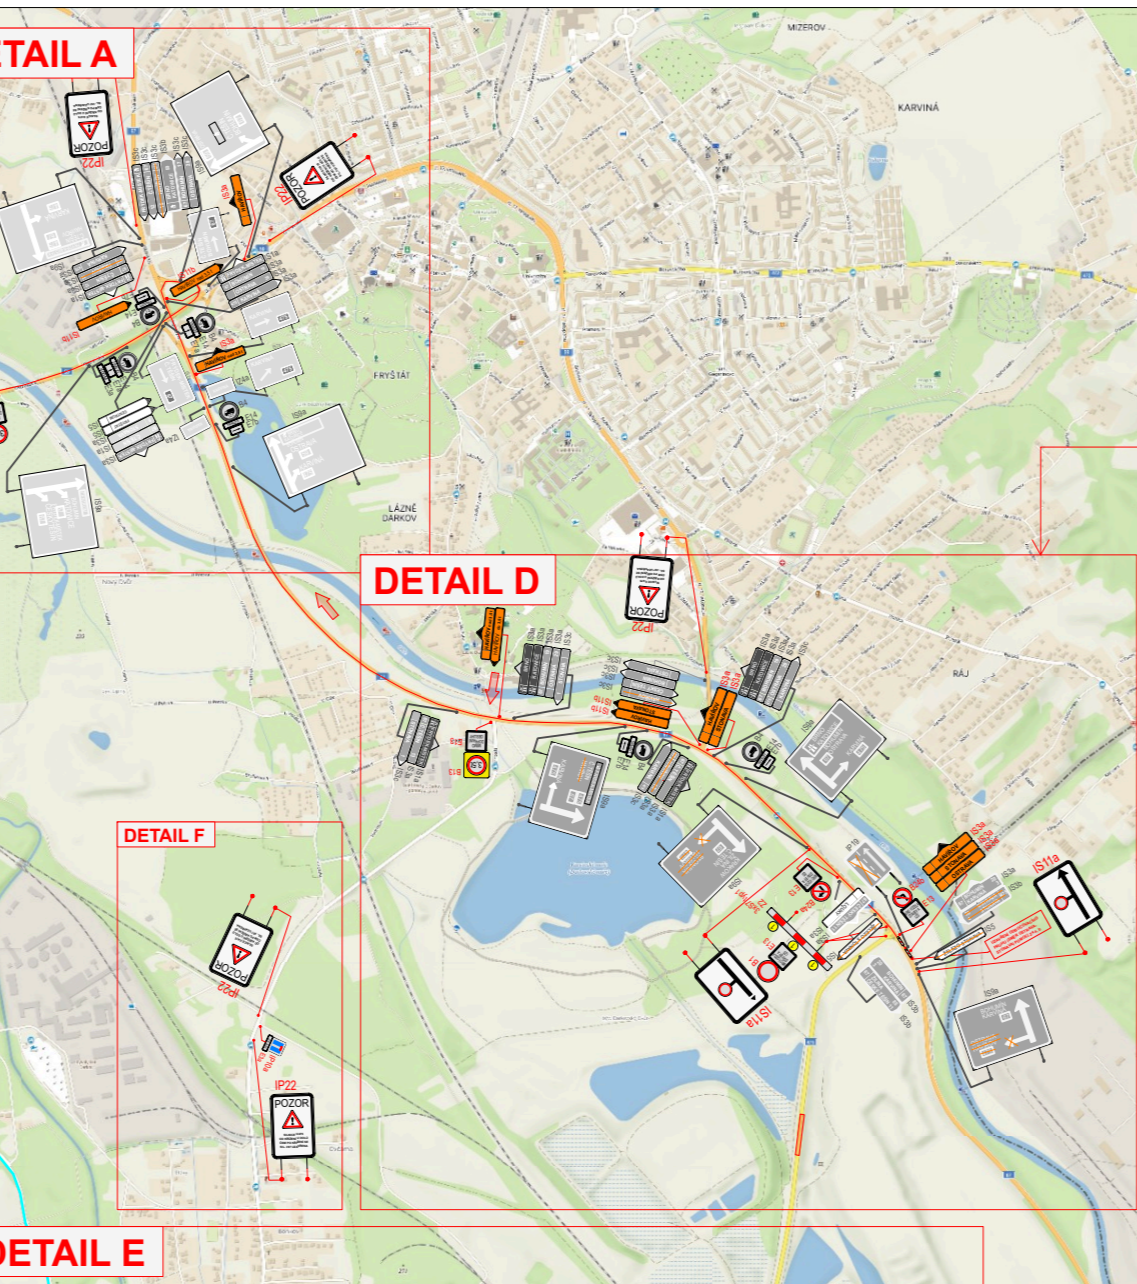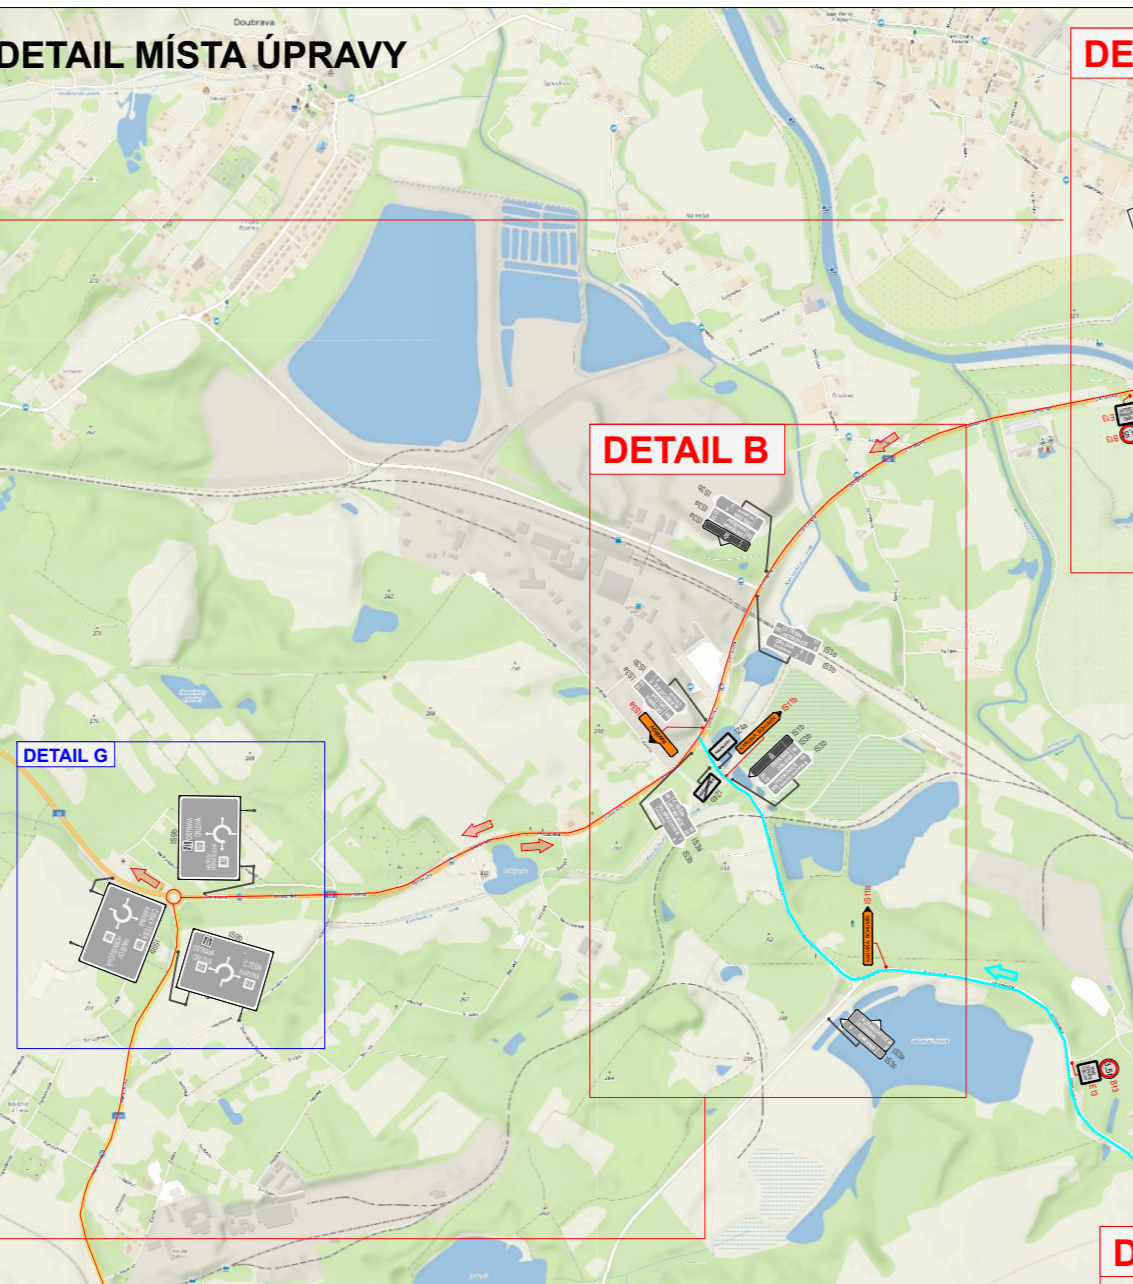

LEGENDA

- Pracovní místa na sil. II/475
- B29 Stávající svlédlé dopravní značení
- B29 Zrušené stávající svlédlé dopravní značení
- B1 Navržené přechodné svlédlé dopravní značení
- Objízdná trasa - Ostrava, Havířov, Stonava, Žilina
- Objízdná trasa - Bohumín, Karviná

VYPRACOVALA BARBORA KUČEROVÁ	DATUM ŘÍJEN 2023	Č. VÝKRESU 01
NÁZEV AKCE Oprava sil. II/475, Stonava		
NÁZEV VÝKRESU Provizorní dopravní značení		



Stavba:
Úprava nivelety silnice II/475 Havířov –
Karviná v km 13,90 – 14,20

Harmonogram prací		2024																		
Členění stavby po úsecích	Datum	duben				květen						červen					červenec			
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Příprava území (odstánění svodidel, asf. krytu, kácení)	15.04.-21.04.			■																
Zemní práce	22.04.-16.06.				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Konstrukční vrstvy vozovky	17.06.-07.07.												■	■	■	■	■	■		
Terénní úpravy	08.07.-21.07.																■	■		
Dokončovací práce (svodidla, dopr. značení)	22.07.-31.07.																	■		
Částeční uzávěra	15.04.-21.04. / 08.07.-21.07.			■													■			
Úplná uzávěra	22.04.-07.07.			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Vypracoval: Ing. Tomáš Šedo

V Šenově u Nového Jičína, dne: 20.03.2024

Stavba:
HMG_Úprava nivelety křižovatky silnice
II/475 Havířov – Karviná km 10,90 - 11,50

Harmonogram prací		2024																												
Členění stavby po úsecích	Datum	duben			květen				červen			červenec					srpen					září				říjen				
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Příprava území (odstánění svodidel, asf. krytu, kácení)	15.04.-21.04.																													
Zemní práce	22.04.-30.06.																													
Odvodnění	01.06.-14.07.																													
Veřejné osvětlení	15.07.-28.07.																													
Konštrukční vrstvy vozovky	29.07.-30.08.																													
Terénní úpravy	02.09.-08.09.																													
Dokončovací práce (svodidla, dopr. značení)	10.09.-22.09.																													
Částečná uzávěra	15.04.-21.04. / 02.09.-22.09.																													
Úplná uzávěra	22.04.-30.08.																													

Vypracoval: Ing. Tomáš Šedo

V Šenově u Nového Jičína, dne: 20.03.2024
